ID	Kód WBS	Task Name	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Příprava	Realizace	Celkem	2003	1.pol. 2004	2.pol. 2004	1.pol. 2005	2.pol. 2005
1	**GIS**	**Navrhované projekty ÚS GIS KrÚ**	**609 dny**	**2.9. 03**	**30.12. 05**		**2 925**	**15 970**	**18 895**	**4 470**	**4 835**	**2 630**	**2 280**	**4 680**
1	**BEG**	**Zahájení prací**	**0 dny**	**2.9. 03**	**2.9. 03**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	MAN	Nutné provozní náklady	609 dny	2.9. 03	30.12. 05	1	0	2 700	2 700	0	200	500	800	1 200
3	MAN.01	Nutné provozní náklady - 1	87 dny	2.9. 03	31.12. 03		0	0	0	0	0	0	0	0
4	MAN.02	Nutné provozní náklady - 2	130 dny	1.1. 04	30.6. 04	3	0	200	200	0	200	0	0	0
5	MAN.03	Nutné provozní náklady - 3	132 dny	1.7. 04	31.12. 04	4	0	500	500	0	0	500	0	0
6	MAN.04	Nutné provozní náklady - 4	129 dny	3.1. 05	30.6. 05	5	0	800	800	0	0	0	800	0
7	MAN.05	Nutné provozní náklady - 5	131 dny	1.7. 05	30.12. 05	6	0	1 200	1 200	0	0	0	0	1 200
8	**SYS**	**Systémové a základní programové vybavení**	**609 dny**	**2.9. 03**	**30.12. 05**	**1**	**1 125**	**2 990**	**4 115**	**1 390**	**1 875**	**250**	**200**	**400**
9	SYS.00	Zahájení SYS	0 dny	2.9. 03	2.9. 03		0	0	0	0	0	0	0	0
10	**SYS.01**	**Architektura systému - podrobný návrh**	**55 dny**	**2.9. 03**	**17.11. 03**	**9**	**300**	**0**	**300**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**SYS.02**	**Základní software pro GIS**	**609 dny**	**2.9. 03**	**30.12. 05**		**0**	**1 440**	**1 440**	**540**	**200**	**100**	**200**	**400**
12	SYS.02.01	Pořízení a instalace ArcIMS	0 dny	2.9. 03	2.9. 03		0	0	0	0	0	0	0	0
13	SYS.02.02	Pořízení a instalace ArcSDE	30 dny	2.9. 03	13.10. 03		0	360	360	360	0	0	0	0
14	SYS.02.03	Pořízení a instalace ArcInfo	30 dny	2.9. 03	13.10. 03		0	180	180	180	0	0	0	0
15	SYS.02.04	Pořízení a instalace dalších komponent	522 dny	1.1. 04	30.12. 05		0	900	900	0	200	100	200	400
16	SYS.02.04.01	Další komponenty zákl. SW GIS 1	130 dny	1.1. 04	30.6. 04		0	200	200	0	200	0	0	0
17	SYS.02.04.02	Další komponenty zákl. SW GIS 2	132 dny	1.7. 04	31.12. 04	16	0	100	100	0	0	100	0	0
18	SYS.02.04.03	Další komponenty zákl. SW GIS 3	129 dny	3.1. 05	30.6. 05	17	0	200	200	0	0	0	200	0
19	SYS.02.04.04	Další komponenty zákl. SW GIS 4	131 dny	1.7. 05	30.12. 05	18	0	400	400	0	0	0	0	400
20	**SYS.03**	**Virtuální mapový server**	**105 dny**	**14.10. 03**	**8.3. 04**		**300**	**350**	**650**	**350**	**300**	**0**	**0**	**0**
21	SYS.03.01	VMS - zprovoznění jádra	20 dny	14.10. 03	10.11. 03	13	75	100	175	175	0	0	0	0
22	SYS.03.02	VMS - zprovoznění mapových služeb	25 dny	11.11. 03	15.12. 03	21	75	100	175	175	0	0	0	0
23	SYS.03.03	VMS - vytvoření a zprovoznění dalších služeb	20 dny	16.12. 03	12.1. 04	22	75	75	150	0	150	0	0	0
24	SYS.03.04	VMS - bezpečnost	40 dny	13.1. 04	8.3. 04	13;23	75	75	150	0	150	0	0	0
25	**SYS.04**	**Metainformační systém**	**217 dny**	**2.9. 03**	**30.6. 04**	**9**	**200**	**200**	**400**	**200**	**200**	**0**	**0**	**0**
26	SYS.04.01	Metainformační systém vnitřní	87 dny	2.9. 03	31.12. 03		100	100	200	200	0	0	0	0
27	SYS.04.02	Metainformační systém - služby pro vnější uživatele	130 dny	1.1. 04	30.6. 04	26	100	100	200	0	200	0	0	0
28	**SYS.05**	**Integrace se systémy třetích stran**	**349 dny**	**2.9. 03**	**31.12. 04**	**12**	**200**	**500**	**700**	**0**	**550**	**150**	**0**	**0**
29	SYS.05.01	Integrace se systémem ePUSA	349 dny	2.9. 03	31.12. 04		50	200	250	0	100	150	0	0
30	SYS.05.01.01	Integrace se systémem ePUSA - 1.etapa	152 dny	2.9. 03	31.3. 04		50	50	100	0	100	0	0	0
31	SYS.05.01.02	Integrace se systémem ePUSA - 2.etapa	197 dny	1.4. 04	31.12. 04	12;30	0	150	150	0	0	150	0	0
32	SYS.05.02	Další integrace se systémy třetích stran	120 dny	2.9. 03	16.2. 04		150	300	450	0	450	0	0	0
33	**SYS.06**	**Podpůrné nástroje**	**140 dny**	**14.10. 03**	**26.4. 04**	**14**	**125**	**500**	**625**	**0**	**625**	**0**	**0**	**0**
34	SYS.06.01	Konverze a kontrola dat	60 dny	14.10. 03	5.1. 04	14	75	300	375	0	375	0	0	0
35	SYS.06.02	Export a import do ArcSDE – podpůrný nástroj	80 dny	6.1. 04	26.4. 04	34;13	50	200	250	0	250	0	0	0
36	SYS.99	Ukončení SYS	0 dny	30.12. 05	30.12. 05	10;20;32;28;31;34;35;26;11	0	0	0	0	0	0	0	0
37	**DAT**	**Data**	**609 dny**	**2.9. 03**	**30.12. 05**	**1**	**1 330**	**6 800**	**8 130**	**2 150**	**1 850**	**1 050**	**500**	**2 580**
38	DAT.00	Zahájení DAT	0 dny	2.9. 03	2.9. 03		0	0	0	0	0	0	0	0
39	**DAT.01**	**Data - obecné projekty**	**70 dny**	**2.9. 03**	**8.12. 03**	**38**	**300**	**380**	**680**	**680**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	DAT.01.01	Založení geodatabáze GIS KÚ	40 dny	14.10. 03	8.12. 03	13	300	300	600	600	0	0	0	0
41	DAT.01.02	Metodika tvorby Geodat	40 dny	2.9. 03	27.10. 03		0	80	80	80	0	0	0	0
42	**DAT.02**	**Data referenční**	**609 dny**	**2.9. 03**	**30.12. 05**	**38**	**680**	**5 620**	**6 300**	**1 420**	**1 500**	**500**	**0**	**2 580**
43	**DAT.02.01**	**Zajištění SGI KN**	**522 dny**	**1.1. 04**	**30.12. 05**		**300**	**2 000**	**2 300**	**0**	**300**	**500**	**0**	**1 500**
44	DAT.02.01.01	Zajištění SGI KN - projekt	80 dny	1.1. 04	21.4. 04		300	0	300	0	300	0	0	0
45	DAT.02.01.02	Zajištění SGI KN - pilotní realizace	182 dny	22.4. 04	31.12. 04	44;13	0	500	500	0	0	500	0	0
46	DAT.02.01.03	Zajištění SGI KN - plná realizace	260 dny	3.1. 05	30.12. 05	45;34	0	1 500	1 500	0	0	0	0	1 500
47	**DAT.02.02**	**Zajištění Zabaged**	**60 dny**	**2.9. 03**	**24.11. 03**		**300**	**50**	**350**	**350**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	DAT.02.02.01	Pořízení Zabaged	0 dny	2.9. 03	2.9. 03		300	0	300	300	0	0	0	0
49	DAT.02.02.02	Implementace Zabaged	60 dny	2.9. 03	24.11. 03	48	0	50	50	50	0	0	0	0
50	**DAT.02.03**	**Zajištění prostorové složky územní identifikace**	**230 dny**	**2.9. 03**	**19.7. 04**		**0**	**370**	**370**	**70**	**0**	**300**	**0**	**0**
51	DAT.02.03.01	Zajištění prostorové složky ÚI - 1.etapa	80 dny	2.9. 03	22.12. 03		0	70	70	70	0	0	0	0
52	DAT.02.03.02	Zajištění prostorové složky ÚI - 2.etapa	150 dny	23.12. 03	19.7. 04	51	0	300	300	0	0	300	0	0
53	**DAT.02.04**	**DPZ / ortofotomapy**	**217 dny**	**2.9. 03**	**30.6. 04**		**0**	**2 200**	**2 200**	**1 000**	**1 200**	**0**	**0**	**0**
54	DAT.02.04.01	DPZ/ortofotomapy - 1.etapa	87 dny	2.9. 03	31.12. 03		0	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0
55	DAT.02.04.02	DPZ/ortofotomapy - 2.etapa	130 dny	1.1. 04	30.6. 04	54	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
56	DAT.02.05	**Digitální model terénu / 3D**	139 dny	3.1. 05	14.7. 05	47;54	80	1 000	1 080	0	0	0	0	1 080
57	**DAT.03**	**Data tématická**	**370 dny**	**6.1. 04**	**6.6. 05**	**38**	**300**	**600**	**900**	**0**	**150**	**250**	**500**	**0**
58	**DAT.03.01**	**Digitální územně plánovací dokumentace**	**370 dny**	**6.1. 04**	**6.6. 05**	**34;41**	**300**	**600**	**900**	**0**	**150**	**250**	**500**	**0**
59	DAT.03.01.01	dÚPD - 1.etapa	70 dny	6.1. 04	12.4. 04		150	0	150	0	150	0	0	0
60	DAT.03.01.02	dÚPD - 2.etapa	100 dny	13.4. 04	30.8. 04	59	150	100	250	0	0	250	0	0
61	DAT.03.01.03	dÚPD - 3.etapa	100 dny	31.8. 04	17.1. 05	60	0	250	250	0	0	0	250	0
62	DAT.03.01.04	dÚPD - 4.etapa	100 dny	18.1. 05	6.6. 05	61	0	250	250	0	0	0	250	0
63	**DAT.04**	**Data ostatní**	**150 dny**	**2.9. 03**	**29.3. 04**	**38**	**50**	**200**	**250**	**50**	**200**	**0**	**0**	**0**
64	**DAT.04.01**	**Implementace dat okresních úřadů**	**150 dny**	**2.9. 03**	**29.3. 04**		**50**	**200**	**250**	**50**	**200**	**0**	**0**	**0**
65	DAT.04.01.01	Záchrana dat OkÚ	80 dny	2.9. 03	22.12. 03		50	0	50	50	0	0	0	0
66	DAT.04.01.02	Zpracování a implementace dat OkÚ	60 dny	6.1. 04	29.3. 04	65;34;41	0	200	200	0	200	0	0	0
67	DAT.99	Ukončení DAT	0 dny	30.12. 05	30.12. 05	39;42;57;63	0	0	0	0	0	0	0	0
68	**APL**	**Aplikační software**	**609 dny**	**2.9. 03**	**30.12. 05**	**1**	**420**	**2 650**	**3 070**	**930**	**760**	**400**	**630**	**350**
69	APL.00	Zahájení APL	0 dny	2.9. 03	2.9. 03		0	0	0	0	0	0	0	0
70	**APL.01**	**Aplikační software - obecný klient**	**147 dny**	**2.9. 03**	**24.3. 04**	**69**	**0**	**500**	**500**	**200**	**300**	**0**	**0**	**0**
71	APL.01.01	Klient VMS	60 dny	2.9. 03	24.11. 03	12	0	200	200	200	0	0	0	0
72	APL.01.03	Desktop klient na platformě ArcObjects	60 dny	1.1. 04	24.3. 04		0	300	300	0	300	0	0	0
73	**APL.02**	**Aplikační software - základní subsystémy**	**90 dny**	**2.9. 03**	**5.1. 04**	**69**	**0**	**650**	**650**	**550**	**100**	**0**	**0**	**0**
74	APL.02.01	Subsystém Katastr nemovitostí	60 dny	2.9. 03	24.11. 03	12	0	400	400	400	0	0	0	0
75	APL.02.02	Subsystém Územní identifikace	60 dny	2.9. 03	24.11. 03	12	0	150	150	150	0	0	0	0
76	APL.02.03	Subsystém Majetek	60 dny	14.10. 03	5.1. 04	12;14	0	100	100	0	100	0	0	0
77	**APL.03**	**Aplikační software - pasportní úlohy**	**260 dny**	**3.1. 05**	**30.12. 05**	**69**	**80**	**350**	**430**	**0**	**0**	**0**	**80**	**350**
78	APL.03.01	Analýza potřebných pasportních úloh	85 dny	3.1. 05	29.4. 05		80	0	80	0	0	0	80	0
79	APL.03.02	Pasportní úlohy pro ZP	175 dny	2.5. 05	30.12. 05	78;71;72;41;49	0	200	200	0	0	0	0	200
80	APL.03.03	Pasportní úloha pro památky	175 dny	2.5. 05	30.12. 05	78;71;72;41;49;45	0	150	150	0	0	0	0	150
81	**APL.04**	**Aplikační software - provozní úlohy**	**262 dny**	**1.1. 04**	**31.12. 04**	**69**	**80**	**200**	**280**	**0**	**80**	**200**	**0**	**0**
82	APL.04.01	Analýza potřebných provozních úloh	130 dny	1.1. 04	30.6. 04		80	0	80	0	80	0	0	0
83	APL.04.02	Provozní úloha pro dopravu	132 dny	1.7. 04	31.12. 04	82;71;72;41;49;59	0	200	200	0	0	200	0	0
84	**APL.05**	**Aplikační software - analytické úlohy**	**413 dny**	**2.9. 03**	**31.3. 05**	**69**	**100**	**550**	**650**	**100**	**0**	**0**	**550**	**0**
85	APL.05.01	Analýza potřebných analytických úloh	87 dny	2.9. 03	31.12. 03		100	0	100	100	0	0	0	0
86	APL.05.02	Aplikace pro krizové řízení	326 dny	1.1. 04	31.3. 05	85	0	350	350	0	0	0	350	0
87	APL.05.03	Aplikace pro regionální rozvoj	239 dny	3.5. 04	31.3. 05	85;59	0	200	200	0	0	0	200	0
88	**APL.06**	**Manažerský GIS**	**262 dny**	**1.1. 04**	**31.12. 04**		**80**	**200**	**280**	**0**	**80**	**200**	**0**	**0**
89	APL.06.01	Manažerský GIS - analytická část	65 dny	1.1. 04	31.3. 04		80	0	80	0	80	0	0	0
90	APL.06.02	Manažerský GIS - realizace	197 dny	1.4. 04	31.12. 04	89	0	200	200	0	0	200	0	0
91	**APL.07**	**Prezentace kraje**	**174 dny**	**2.9. 03**	**30.4. 04**		**80**	**200**	**280**	**80**	**200**	**0**	**0**	**0**
92	APL.07.01	Prezentace kraje - analytická část	87 dny	2.9. 03	31.12. 03		80	0	80	80	0	0	0	0
93	APL.07.02	Prezentace kraje - realizace	87 dny	1.1. 04	30.4. 04	92	0	200	200	0	200	0	0	0
94	APL.99	Ukončení APL	0 dny	30.12. 05	30.12. 05	70;73;77;81;84;88;92	0	0	0	0	0	0	0	0
95	**LID**	**Lidské zdroje**	**609 dny**	**2.9. 03**	**30.12. 05**	**1**	**50**	**830**	**880**	**0**	**150**	**430**	**150**	**150**
96	LID.00	Zahájení LID	0 dny	2.9. 03	2.9. 03		0	0	0	0	0	0	0	0
97	**LID.01**	**Odborná příprava pro GIS**	**522 dny**	**1.1. 04**	**30.12. 05**		**0**	**600**	**600**	**0**	**150**	**150**	**150**	**150**
98	LID.01.01	Odborná příprava pro GIS - etapa 1	130 dny	1.1. 04	30.6. 04		0	150	150	0	150	0	0	0
99	LID.01.02	Odborná příprava pro GIS - etapa 2	132 dny	1.7. 04	31.12. 04	98	0	150	150	0	0	150	0	0
100	LID.01.03	Odborná příprava pro GIS - etapa 3	129 dny	3.1. 05	30.6. 05	99	0	150	150	0	0	0	150	0
101	LID.01.04	Odborná příprava pro GIS - etapa 4	131 dny	1.7. 05	30.12. 05	100	0	150	150	0	0	0	0	150
102	**LID.02**	**Prezentace možností GIS**	**40 dny**	**1.7. 04**	**25.8. 04**		**0**	**80**	**80**	**0**	**0**	**80**	**0**	**0**
103	**LID.03**	**Pravidla pro užívání dat**	**40 dny**	**1.7. 04**	**25.8. 04**		**0**	**50**	**50**	**0**	**0**	**50**	**0**	**0**
104	**LID.04**	**Vnější vztahy v GIS**	**40 dny**	**1.7. 04**	**25.8. 04**		**50**	**100**	**150**	**0**	**0**	**150**	**0**	**0**
105	LID.99	Ukončení LID	0 dny	30.12. 05	30.12. 05	97;102;103;104	0	0	0	0	0	0	0	0
106	**END**	**Ukončení prací**	**0 dny**	**30.12. 05**	**30.12. 05**	**8;37;68;95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

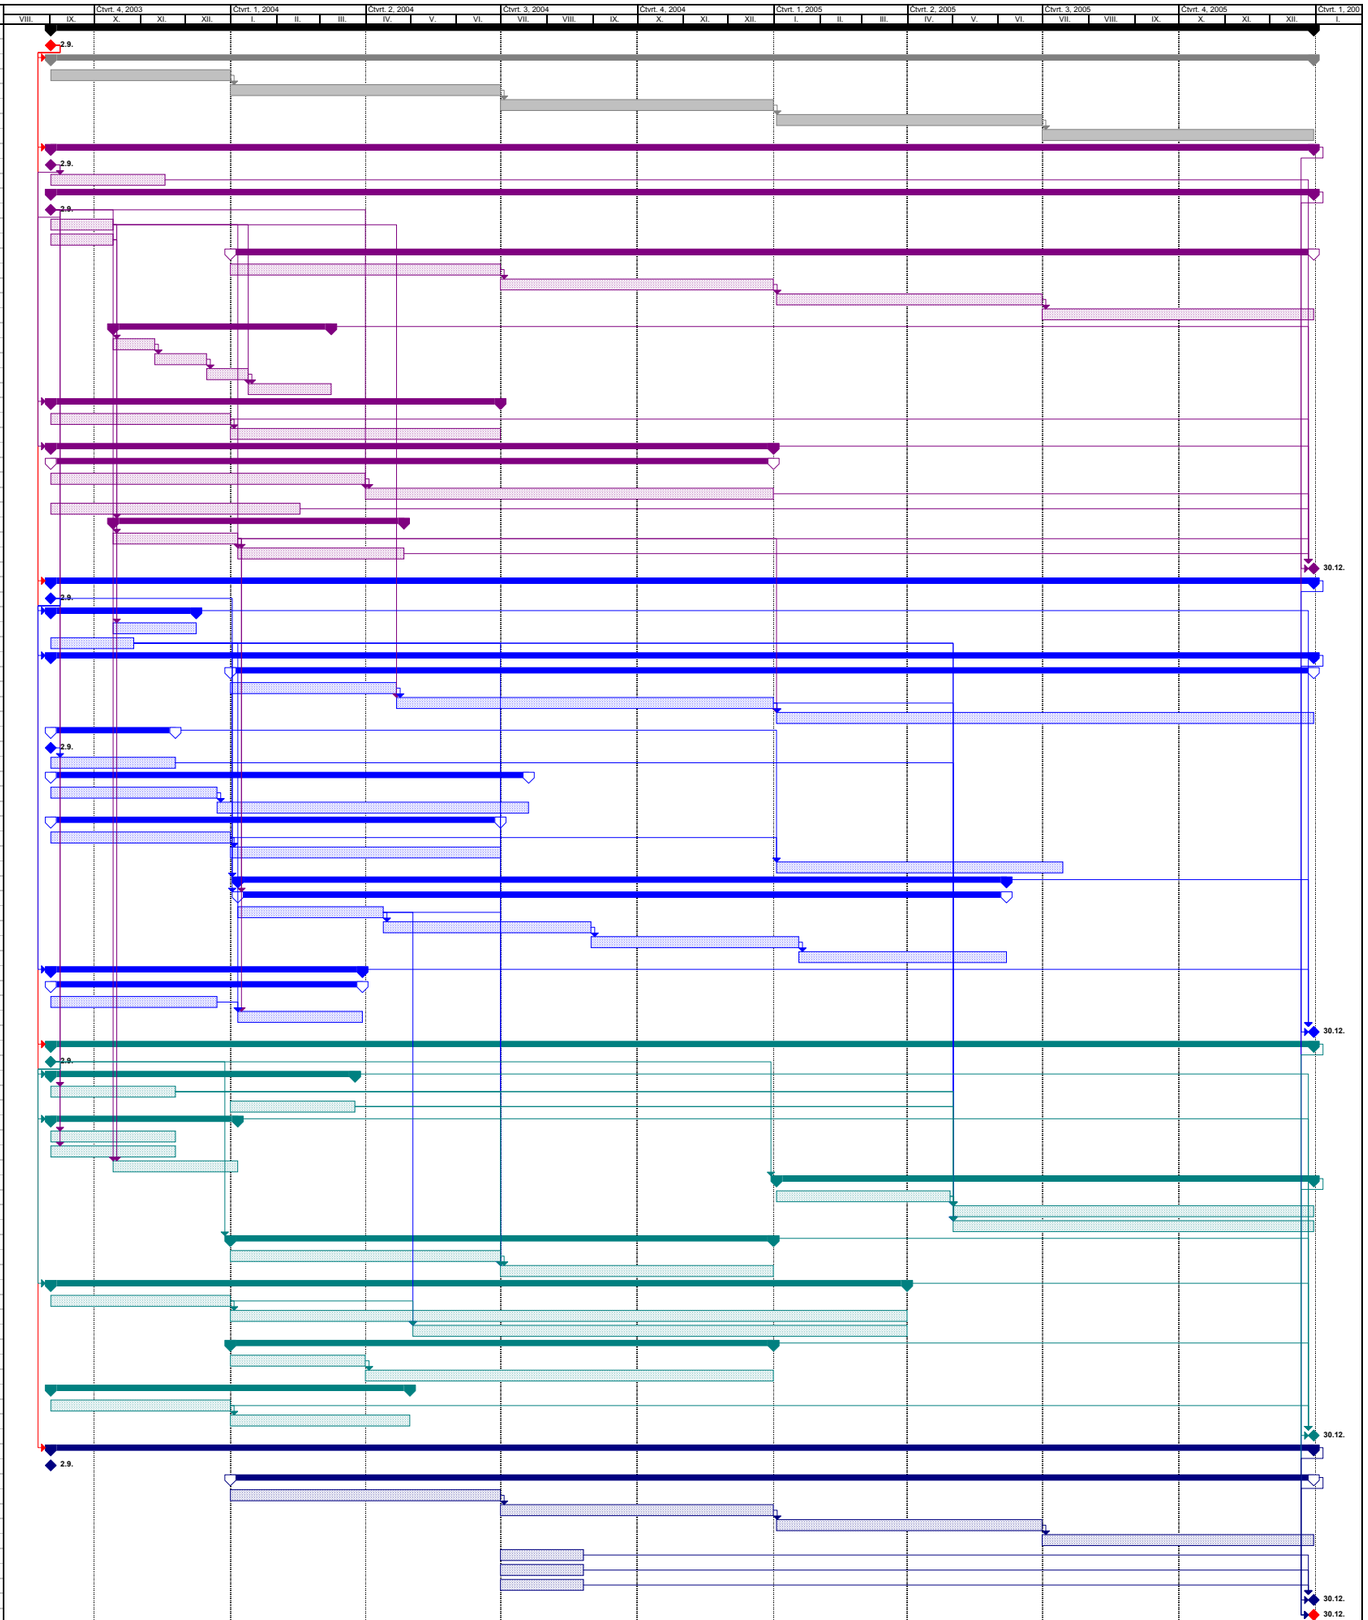

Project: Navrhované projekty ÚS GIS K
Date: 30.6. 03

Task · Split · Progress · Milestone · Summary · Rolled Up Task · Rolled Up Split · Rolled Up Milestone · Rolled Up Progress · External Tasks · Project Summary · Vnější milník
